


## 現在の作業状況

3月末現在の進捗率は約50%です。当初の予定通り進捗しています。

幼稚園・小学校校舎部分(右図黄色部分)の躯体工事は完了し、職員室・特別教室部分(右図青色部分)は5階部分の躯体工事をを行っています。4月上旬には職員室・特別教室部分の躯体工事も完了し、上棟を迎える予定です。上棟後はメインエントランスのスロープ部分(右図赤色部分)の躯体工事を行う予定です。

建物内部では1・2階の天井内電気配線・設備配管工事、各教室の間仕切壁の取り付け工事、3階では電気配線・設備配管工事を行っています。地下のプール部分では天井内電気・設備工事が終わり、天井パネルの取り付けを行っています。

建物外部では体育館の3・4階の壁、屋根のパネルの下地工事を行っています。職員室・特別教室部分の1階北側、幼稚園・小学校校舎南側ではテラコッタタイルの下地取付作業を行っています。

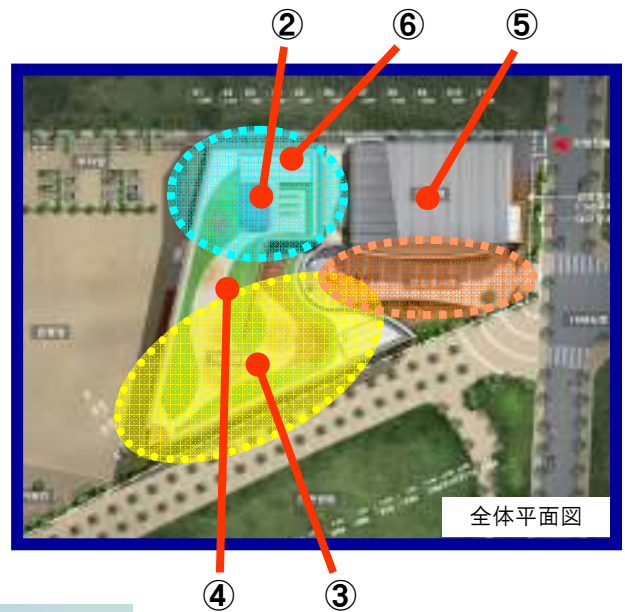

### 【写真の説明】

- ①全景写真(敷地の南側より)
- ②職員室・特別教室部分(上図青色部分)  
→5階躯体工事中
- ③2階小学校教室部分  
→各教室の間仕切壁の取り付け工事中
- ④地下プール部分  
→プールの天井パネル取付工事中
- ⑤体育館(南側より)  
→外壁・屋根パネルの下地工事中
- ⑥職員室・特別教室部分1階  
→テラコッタタイルの下地取付工事中

また紙面を充実させるため、皆様のご意見、ご感想他取り上げて欲しい内容がありましたらご一報いただければと思っております。

連絡先は以下のとおりです。  
E-mail : kefujimoto@fujita.co.jp  
Tel. 02-306-7173  
FAX. 02-306-7173  
担当. 藤本(フジモト)

発行者 株式会社フジタ ソウル支店  
ソウル日本人学校作業所  
ソウル特別市 麻浦区 上岩洞 A1-2  
Tel. 02-306-7173  
Fax.02-306-1900  
URL:<http://www.fujita.co.jp/>
