


現在の作業状況

4月末現在の進捗率は約57%です。当初の予定通り進捗しています。

躯体工事はメインエントランスのスロープ部分を含め完了し、校舎の躯体工事は完了しました。現在は内外部とも仕上工事をしています。外部は体育館の外装は完了し、該当部分の足場を解体いたしました。その他の部分のテラコッタタイル・鋼製建具取付工事をしています。屋上は防水工事が完了し、防水上の仕上コンクリート工事の準備中です。

内部は1階では天井ボード工事、2～5階で壁の間仕切工事をしています。地下のプールでは水槽内の防水工事が完了し、壁・床のタイル工事をしています。

2階の小学校1・2年生用の教室の1室を先行して完了させました。これは実際に取付けられる机・椅子などを設置し、問題点の事前把握や他の教室の施工の参考にするために行ったものです。教室の特徴は黒板ではなく白板を設置し、プロジェクターを取付けています。プロジェクター使用時は白板がスクリーンとなります。幼稚園、小学校1・2年生の教室では手洗い用のシンクがあります。

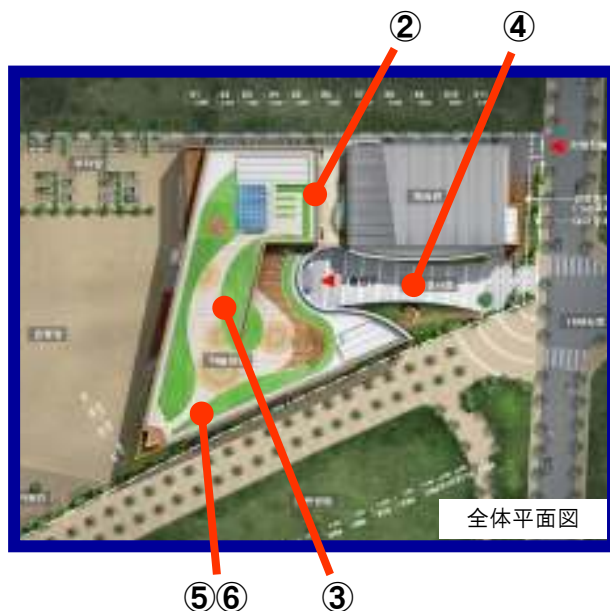

【写真の説明】

- ① 全景写真(敷地の南側より)
- ② 特別教室部分外部(東側)
→外装テラコッタタイル工事中
- ③ 地下プール部分
→プール内部壁タイル工事中
- ④ メインエントランス部分
→躯体工事完了
- ⑤⑥ 2階モデルルーム内部
→家具、机・椅子の据付まで完了
(1・2年生の教室は写真のようになります)

また紙面を充実させるため、皆様のご意見、ご感想他取り上げて欲しい内容がありましたらご一報いただければと思います。

連絡先は以下のとおりです。
E-mail : kefujimoto@fujita.co.jp
Tel. 02-306-7173
FAX. 02-306-7173
担当. 藤本(フジモト)

発行者 株式会社フジタ ソウル支店
ソウル日本人学校作業所
ソウル特別市 麻浦区 上岩洞 A1-2
Tel. 02-306-7173
Fax.02-306-1900
URL:<http://www.fujita.co.jp/>
